

CALENDARITZACIÓ DE PROJECTES

Causes fonamentals de retards

- Una data límit irreal establerta per algú extern al equip de software.
- Requeriments del client que no es reflecteixen en canvis al calendari.
- Una honesta subestimació de la quantitat d'esforç i/o nombre de recursos que es requeriran per a fer la feina.
- Riscos predictibles i/o impredecibles que no es varen considerar quan va començar el projecte.
- Dificultats humanes que no es podien preveure per anticipat.
- Falta de comunicació entre el personal del projecte que dona com a resultat demores.
- Falta de comunicació entre l'equip de treball que es tradueix en retards.
- Una errada per part de l'administració del projecte per reconèixer que el projecte té retards al calendari i una falta d'acció per corregir el problema.

Principis bàsics (I)

- **Compartimentalització.** El projecte s'ha de compartimentar en activitats i tasques manejables. S'han de desglossar tant el producte com el procés.
- **Interdependència.** S'ha de determinar la interdependència de cada activitat o tasca compartimentalitzada. Algunes tasques han de succeir-se en seqüència, mentre altres poden ocórrer en paral·lel. Algunes activitats no poden començar fins que estiga disponible el resultat d'altra. Altres es poden fer independentment.
- **Assignació de temps.** A cada tasca per calendaritzar s'ha d'assignar un cert nombre d'unitats de treball (per exemple, persones-dies d'esforç). A més, a cada tasca s'ha d'assignar una data de començament i una de conclusió, en funció de les interdependències i de si el treball es farà sobre una base de temps complet o parcial.


Principis bàsics (II)

- **Validació de l'esforç.** Tot projecte te un nombre definit de persones a l'equip de software. S'ha d'assegurar que no s'ha calendaritzat més que el nombre de personal assignat.
- **Responsabilitats definides.** Cada tasca per calendaritzar s'ha d'assignar a un membre específic de l'equip.
- **Resultats definits.** Cada tasca que es calendaritze ha de tindre un resultat definit. Per a projectes software, el resultat normalment és un producte operatiu o una part del producte operatiu.
- **Fites definides.** Cada tasca o grup de tasques s'ha d'associar amb una fita del projecte. Una fita s'aconsegueix quan un o més productes operatius es revisen en la seva qualitat i s'aproven.

Cronogrames

- Els cronogrames o gràfiques de Gantt és un diagrama on es representa la calendarització de les tasques d'un projecte.
- Permet realitzar el seguiment i el control del progrés de cadascuna de les etapes d'un projecte.
- Reprodueix gràficament les tasques, la seva duració i seqüència, a més del calendari general del projecte.

Exemple cronograma

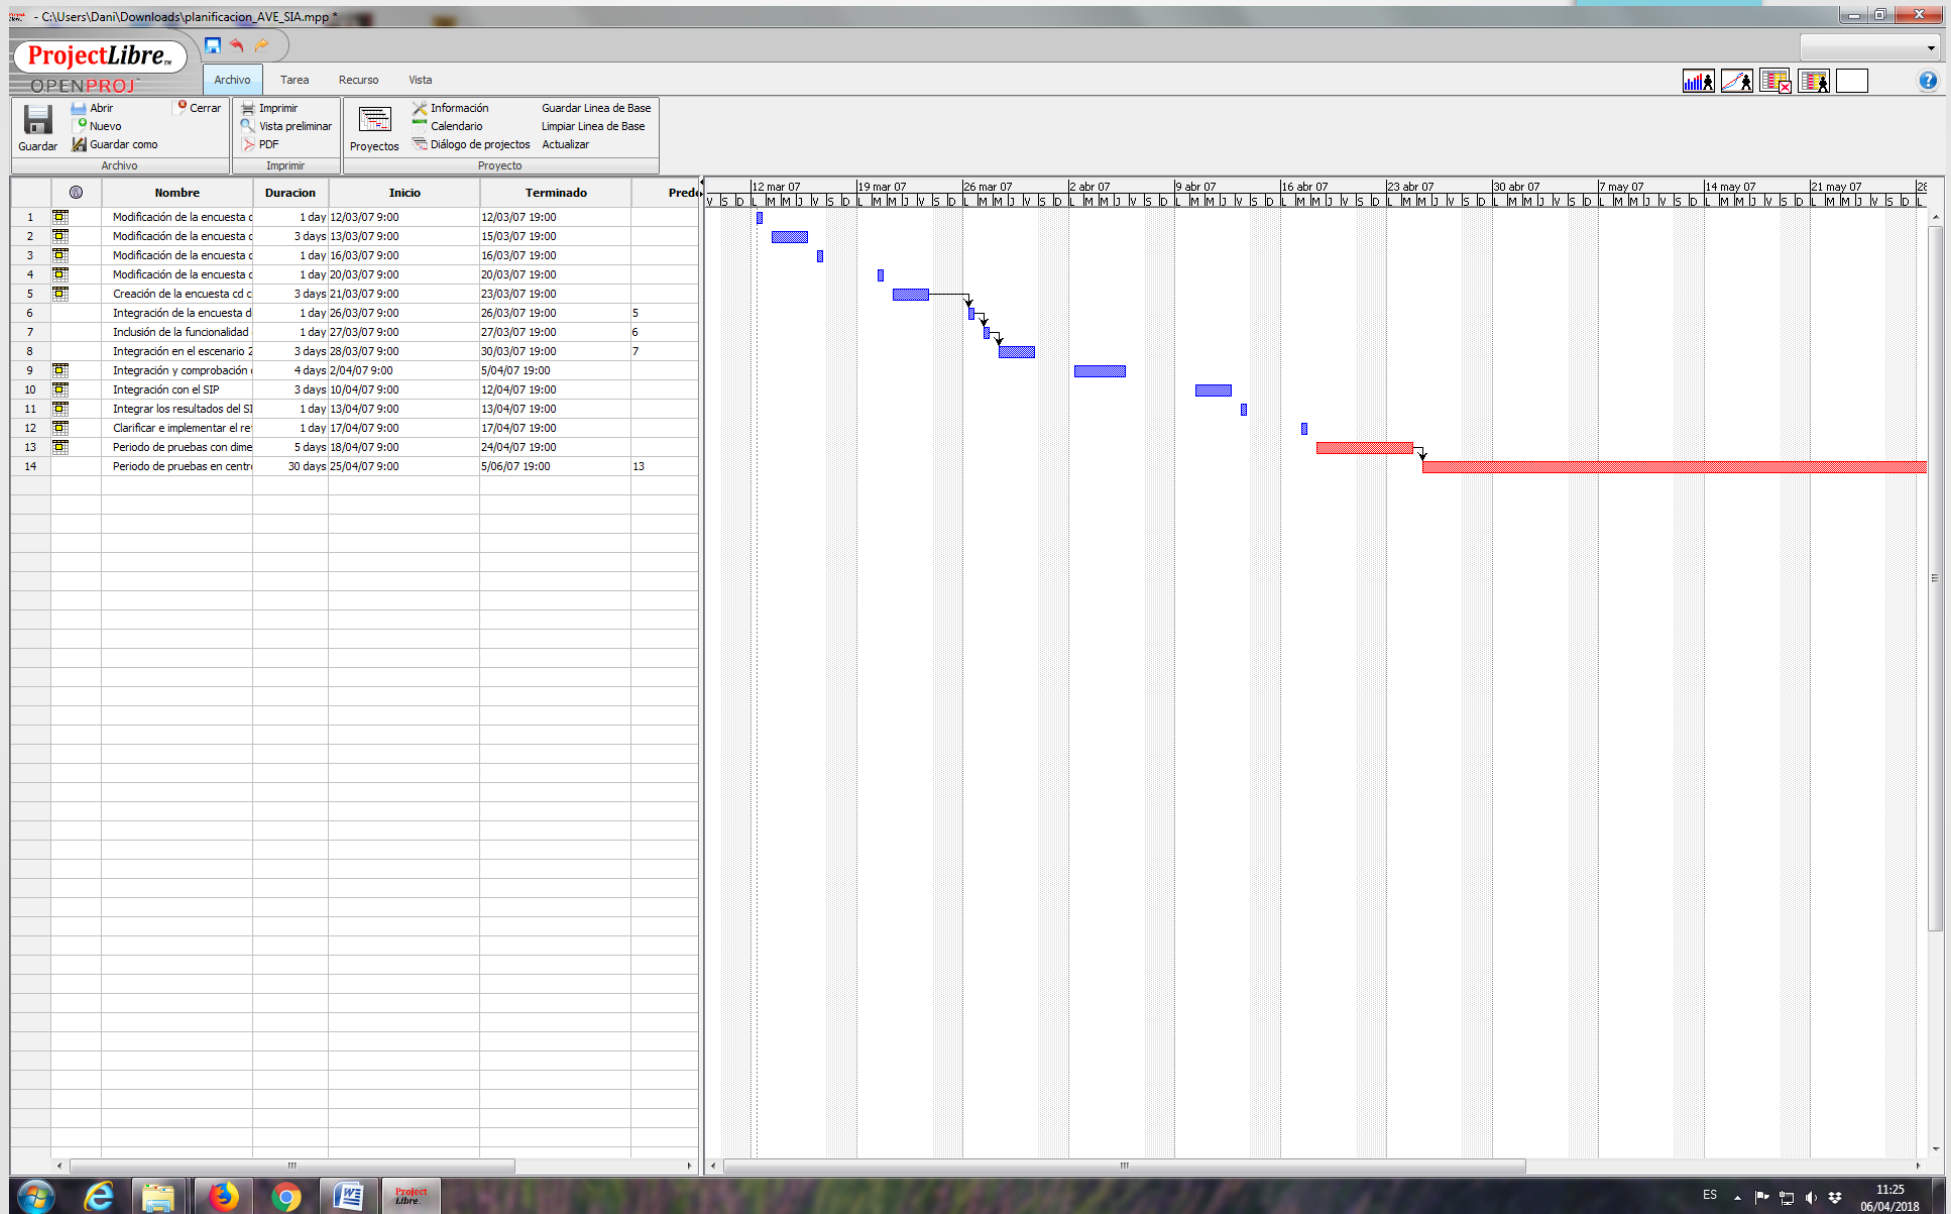

Seguiment del calendari

- Realitzar reunions periòdiques de l'estat del projecte, en las que cada membre de l'equip reporte avanços i problemes.
- Avaluar els resultats de les revisions realitzades.
- Determinar si les fites formals del projecte s'han aconseguit en la data prevista.
- Comparar la data de inici reial amb la data de inici planejada per a cada tasca del projecte.
- Reunir-se amb els professionals per a obtindre la seva valoració subjectiva de l'avanç a la data i els problemes a l'horitzó.

Recursos

- Teoría:
 - Roger S. Pressman, "Ingeniería del software. Un enfoque práctico. 7ª edición". McGrawhill, México, 2010
- Software:
 - EleGantt for Trello
 - ProjectLibre
 - Ms Project
 - Templates per a LibreOffice
